

Seguimiento Plan de Acción 31 de Diciembre de 2018

Medellín cuenta con vos




Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)


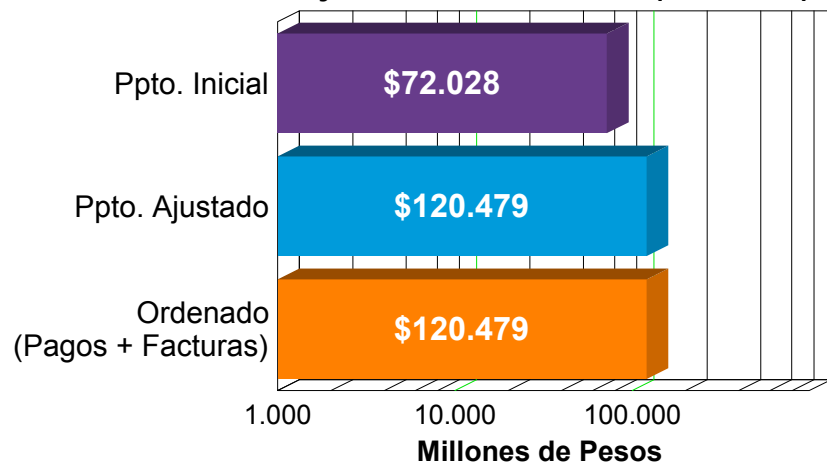


Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto

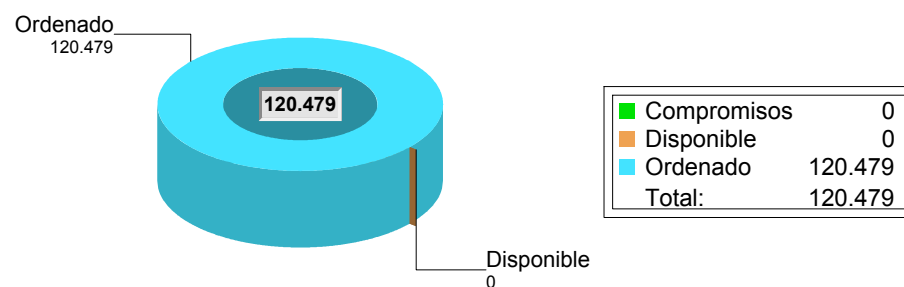

La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)

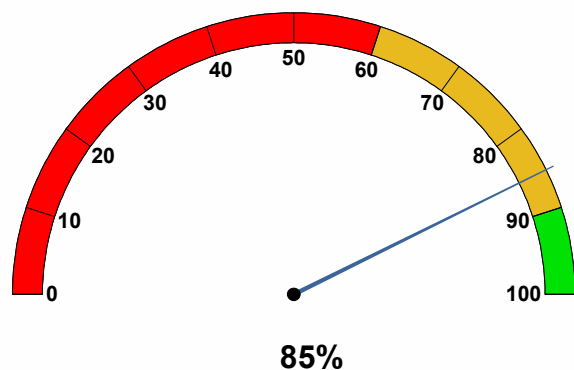


Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)


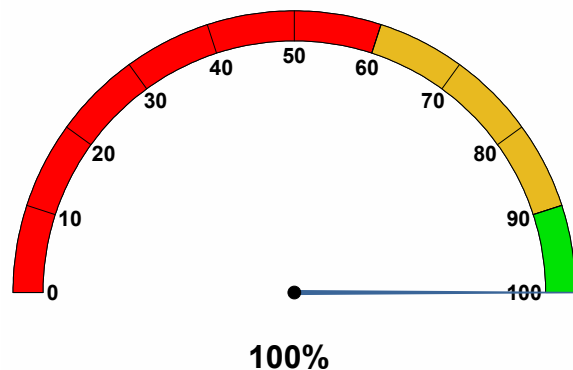


Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec Fra) (%)

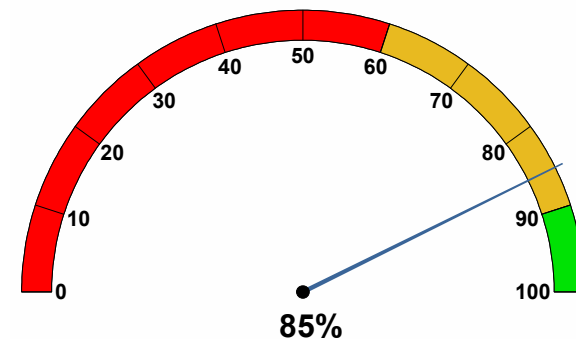

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana
Reto: 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía
Programa: 2.2.2 - Promoción de la convivencia
Proyecto PD: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales
Proyecto: 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.824 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.824

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	%	100	100	100%

Observación Proyecto: Durante el año 2018 se desarrollaron 1.819 acciones de acompañamiento a los proyectos VIP – VIS que se centraron en la asesoría a miembros de los órganos de administración y dirección de las copropiedades para el fortalecimiento de conocimientos y habilidades jurídicas, administrativas, contables y sociales.

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios
Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín
Programa: 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional
Proyecto PD: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional
Proyecto: 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 125 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 125

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	49	49	100%

Observación Proyecto: En el año 2018 se consolidó el proyecto de decreto para la creación del CCMPH, con la participación de diferentes instancias de la Alcaldía de Medellín, en un escenario interinstitucional que se denominó "Comité Ampliado del Plan Estratégico Habitacional". Se realizó la radicación en la Secretaría General de la Alcaldía de Medellín.

Proyecto PD: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

Proyecto: 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

Síntesis Proyecto: Eficacia : 85% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 85%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 952 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 952

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	95	80,42	85%

Observación Proyecto: Se realizó la exploración técnica y se culminó la etapa de diagnóstico a través de un proceso participativo, de construcción colectiva, donde se validó y complementó el diagnóstico técnico. Se contó con la participación de actores sociales-territoriales, públicos, privados, académicos y sociales-solidarios, ONGs y OPVs, por zonas urbanas y los corregimientos.

Proyecto PD: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

Proyecto: 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

Síntesis Proyecto: Eficacia : 87% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 87%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 223 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	87,49	87%

Observación Proyecto: Se trabajó en el proyecto de decreto para la reglamentación de la política de inquilinatos, con las dependencias que participan en la Mesa de Inquilinatos, actividad orientada a crear agendas de trabajo y generar espacios de participación y construcción en pro de los procesos que se llevan a cabo en los inquilinatos de la ciudad. Se radicó el proyecto de decreto en la Secretaría General.

Programa: 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

Proyecto PD: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

Proyecto: 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

Síntesis Proyecto: Eficacia : 90% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 90%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 7.468 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 7.468

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	114	91	80%
IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	%	100	100	100%

Proyecto: 170033 - Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 300 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 300

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV33AB Hog. de reasentam. por o.p. atendidos	%	100	100	100%

Observación Proyecto: 65 viviendas definitivas entregadas. Se realizó también la asesoría y acompañamiento necesario a los hogares intervenidos, para facilitar el proceso de traslado e inserción al nuevo hábitat donde se tienen alternativas de reasentamiento en vivienda nueva o usada, mitigando aquellos impactos causados por el desplazamiento involuntario.

Proyecto PD: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

Proyecto: 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 88%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.698 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 8.698

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	37	168	454%
Observación B / S: Los resultados corresponden a los subsidios asignados, la mayor ejecución se presenta por el ingreso de recursos del bajance como apoyo a la ejecución del proyecto.				
IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	257	194	75%
Observación B / S: Proyectos iniciados: Colinas de Occidente: 120 unidades de vivienda, Castilla - Girardot: 74 unidades de vivienda				

Proyecto PD: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

Proyecto: 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 15.696 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 15.696

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.200	3.873	92%
Observación B / S: Para el mes de diciembre de 2018 se obtuvo un total acumulado de 3.873 hogares atendidos y un total de 3.254 hogares activos				

Programa: 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

Proyecto PD: 6.5.3.1 Vivienda nueva

Proyecto: 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 59%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.386 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 26.386

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	331	182	55%
Observación B / S: Los resultados corresponden a los subsidios asignados en convenio con las cajas de compensación				
IV92AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.847	782	42%
Observación B / S: Proyectos iniciados: Colinas de occidente, 680 unidades de vivienda. La Colinita, 102 unidades de vivienda.				
IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	563	0	0%
Observación B / S: Se avanzó con la ejecución de los siguientes proyectos: - Arboleda de San Antonio con 115 unidades de vivienda, este proyecto en el mes de diciembre presentó un avance de ejecución del 58%. - Ciudad del Este Etapa C con 448 unidades de vivienda, este proyecto al mes de diciembre presentó un avance de ejecución del 81%.				
IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	2.854	4.559	160%
Observación B / S: La mayor ejecución responde al cambio en la estrategia de trabajo con el sector privado, los resultados corresponden a capacitaciones realizadas a constructores privados sobre las generalidades del convenio de asociación Demanda Libre que se tiene con las Cajas de Compensación Familiar, los requisitos generales del decreto 2339 de 2013 y el proceso de legalización de subsidios ya asignados.				
IV92AF Demanda I con viv en proyectos privados	Número	331	985	298%

Observación B / S: La mayor ejecución responde al cambio en la estrategia de trabajo con el sector privado, los proyectos promovidos a través de alianzas con el sector privado han sido receptores de subsidios con las cajas de compensación, por lo cual, los resultados corresponden a la cantidad de hogares de demanda libre beneficiados con subsidios durante el año 2018.

Proyecto PD: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

Proyecto: 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 301 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 301

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	%	100	100	100%

Observación B / S: Metros cuadrados evaluados: 1.312.968,32. Las actividades se centraron en la evaluación preliminar normativa de lotes, elaboración de simulaciones urbanísticas, solicitud de conceptos normativos y técnicos, análisis de las UAU correspondientes al desarrollo del proyecto Conexión Vial Norte, la actualización de inmuebles clasificados como lotes de futuro desarrollo del Isvimed.

Proyecto PD: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 584 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 584

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	%	100	100	100%

Observación B / S: 81 actividades de acompañamiento social, técnico y jurídico a las OPV. Se realizaron reuniones y asesorías técnicas para formulación de nuevos proyectos y para acompañar el avance de las obras de las OPV y la resolución de dificultades sociales y técnicas; se realizaron visitas a las familias y reuniones intrainstitucionales y se desarrolló una capacitación con el Sena, sobre propiedad horizontal.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AB Subsidios para opv asignados	Número	10	10	100%

Observación B / S: Los resultados corresponden a los subsidios asignados a la OPV Amcaf.

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.621 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 47.673 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 47.673

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.786	3.057	110%

Observación B / S: La mayor ejecución corresponde a una mayor cantidad de subsidios asignados, a partir del ingreso de recursos de superavit

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	139	147	106%

Observación B / S: La mayor ejecución corresponde a un aumento en la cantidad de víctimas identificadas a partir de la base de datos de la Unidad de Víctimas

IV95AC	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	1.158	952	82%
--------	--------------------------------------	--------	-------	-----	-----

Proyecto PD: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 361	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 132	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	%	100	100	100%
Observación B / S: Durante el año 2018 se revisaron las acciones desarrolladas correspondientes al proyecto MEB, con el propósito de direccionar de manera eficiente las actividades futuras. Posteriormente se analizaron las posibilidades de estructuración del proyecto mediante posibles alianzas estratégicas con entidades que tengan injerencia en la transformación territorial.				

Proyecto PD: 6.5.4.3 Titulación de predios

Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	------

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 409	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 484	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 484
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	750	800	107%
Observación B / S: La mayor ejecución corresponde a la reestructuración de la estrategia y del grupo de apoyo con miras al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo.				
IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	38	51	134%
Observación B / S: La mayor ejecución corresponde a un aumento en la cantidad de víctimas identificadas a partir de la base de datos de la Unidad de Víctimas				

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 86%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	86%
---------------------------	-----------------------	--------------------------------	---	-----

Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.028	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.028
--------------------------------	--	---	--

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	2.180	1.551	71%
Observación B / S: Los resultados corresponden a los reconocimientos que obtuvieron resoluciones de curaduría durante el 2018, la diferencia respecto a la meta se verá reflejada en las resoluciones que se obtengan en los primeros meses del año 2019.				
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	332	1.551	467%

Observación B / S: La mayor ejecución responde al cambio en la metodología de medición del indicador, teniendo en cuenta que el reconocimiento de las viviendas implica la habilitación para conexión legal a los servicios públicos y que EPM ya no conecta las viviendas a los servicios públicos bajo el requisito preliminar del reconocimiento. Se iguala la medición al indicador de reconocimiento de edificaciones

Proyecto PD: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

Proyecto: 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 47%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	806	360	45%
Observación B / S: La terminación de las obras de los proyectos Montaña y Cascada se pospone para la siguiente vigencia, por lo que se desplaza el proceso de escrituración				
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	167	83	50%
Observación B / S: Se trabaja en estrategias institucionales para solucionar las dificultades que impiden la escrituración de las viviendas.				

2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

Dimensión: 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

Reto: 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

Programa: 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

Proyecto PD: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

Proyecto: 170099 - 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	102	102	100%

Proyecto: 180014 - 18pp6-mejoramiento de vivienda en doce de octubre

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.344

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV14AA Viviendas mejoradas	Número	200	200	100%

Proyecto: 180015 - 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

Síntesis Proyecto: Eficacia : 96% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 96%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.344

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV15AA Sub. para mejoramie. de vivienda asignad	Número	200	192	96%

Proyecto PD: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

Proyecto: 170098 - 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios

Síntesis Proyecto: Eficacia : 74% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 74%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.000

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	65	76	117%

Observación B / S: La mayor ejecución corresponde a una mayor cantidad de subsidios asignados para mejoramiento de vivienda en esta comuna, obtenida a partir de la optimización de los recursos.

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución	Número	100	48	48%

Observación B / S: Los resultados corresponden a los reconocimientos que obtuvieron resoluciones de curaduría durante el 2018, la ejecución de este proyecto continúa para la vigencia 2019

Proyecto: 170100 - 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%


Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución	Número	130	130	100%



Seguimiento Plan de Acción 31 de Diciembre de 2018

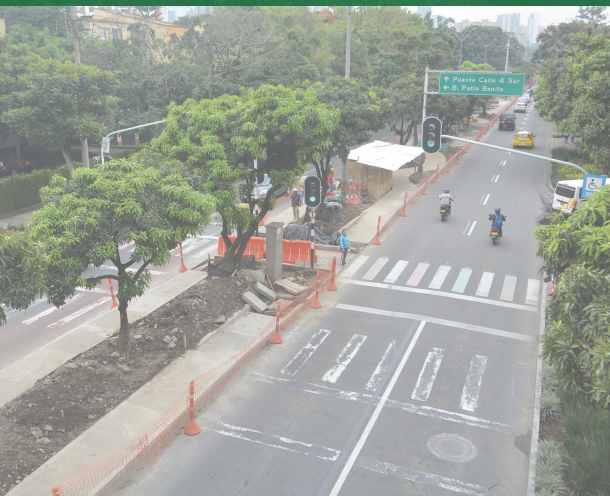

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
